




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.




www.ope.moew.government.bg




Структурни фондове за околна среда – напредък

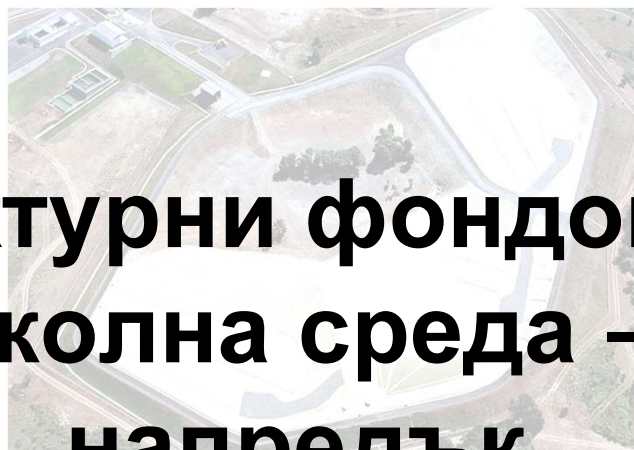


11 април 2012 г.



Ивелина Василева
Заместник-министър на
околната среда и водите

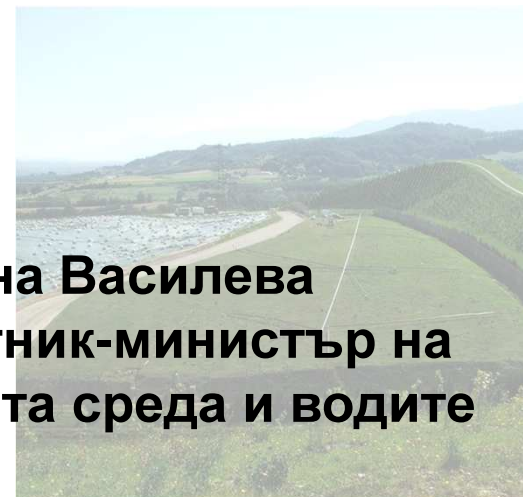

Общ напредък на програмата

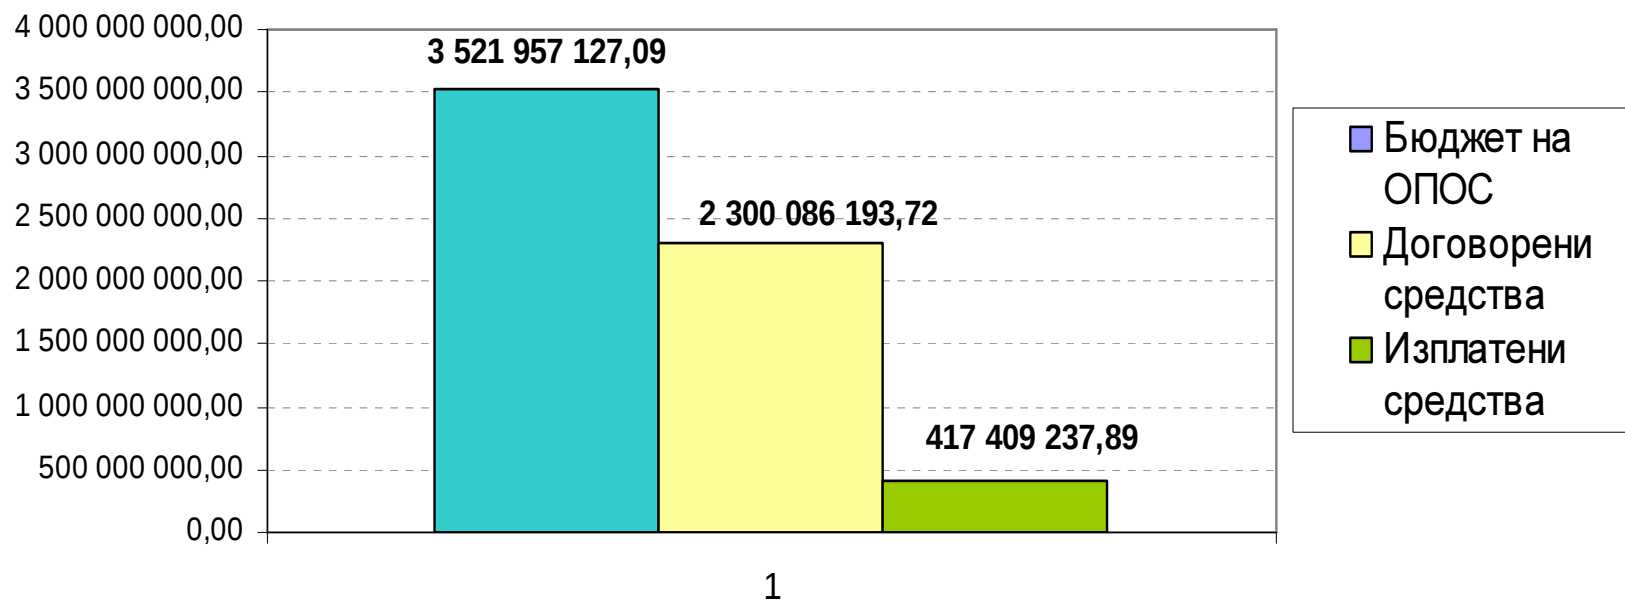

Договорени средства
65,3 % от бюджета

Изплатени средства
11,85 % от бюджета

Напредък за I-во тримесечие на 2012 г.

- **Нови 45 договора на стойност 537 млн. лв.**
- **Плащания към бенефициентите – 30 млн. лв.**
- **Успешно приключили 18 проекта с усвоени близо 40 млн. лв.**

Сектор “води”



В изпълнение:

101 договора/заповеди (44 само за техническа помощ, 30 за изграждане на ВиК инфраструктура, 1 заповед за Басейнова дирекция – Благоевград, 26 за подготовка и строителство на ВиК инфраструктура) на стойност близо 1,91 млрд. лв.

Успешно приключили:


- 69 договора за ТП с общ размер на усвоената БФП 46 млн.лв.
- 5 договора за изграждане на инфраструктура на общините Бургас (кв. Долно Езерово), Вълчи Дол, Приморско, Главиница и Перник с общ размер на усвоената БФП 64 млн. лв.

В оценка:

- 72 проектни предложения за ВиК инфраструктура за агломерации над 10 000 е.ж. на обща индикативна стойност около 2,7 млрд. лв.
- Изпратени за оценка в ЕК са проектите на Добрич – Фаза I, Пловдив и Асеновград (362 млн. лв.)

Предстоящи процедури:

- “Разработване на планове за управление на риска от наводнения” с конкретен бенефициент Басейнови дирекции – 20,5 млн. лв.

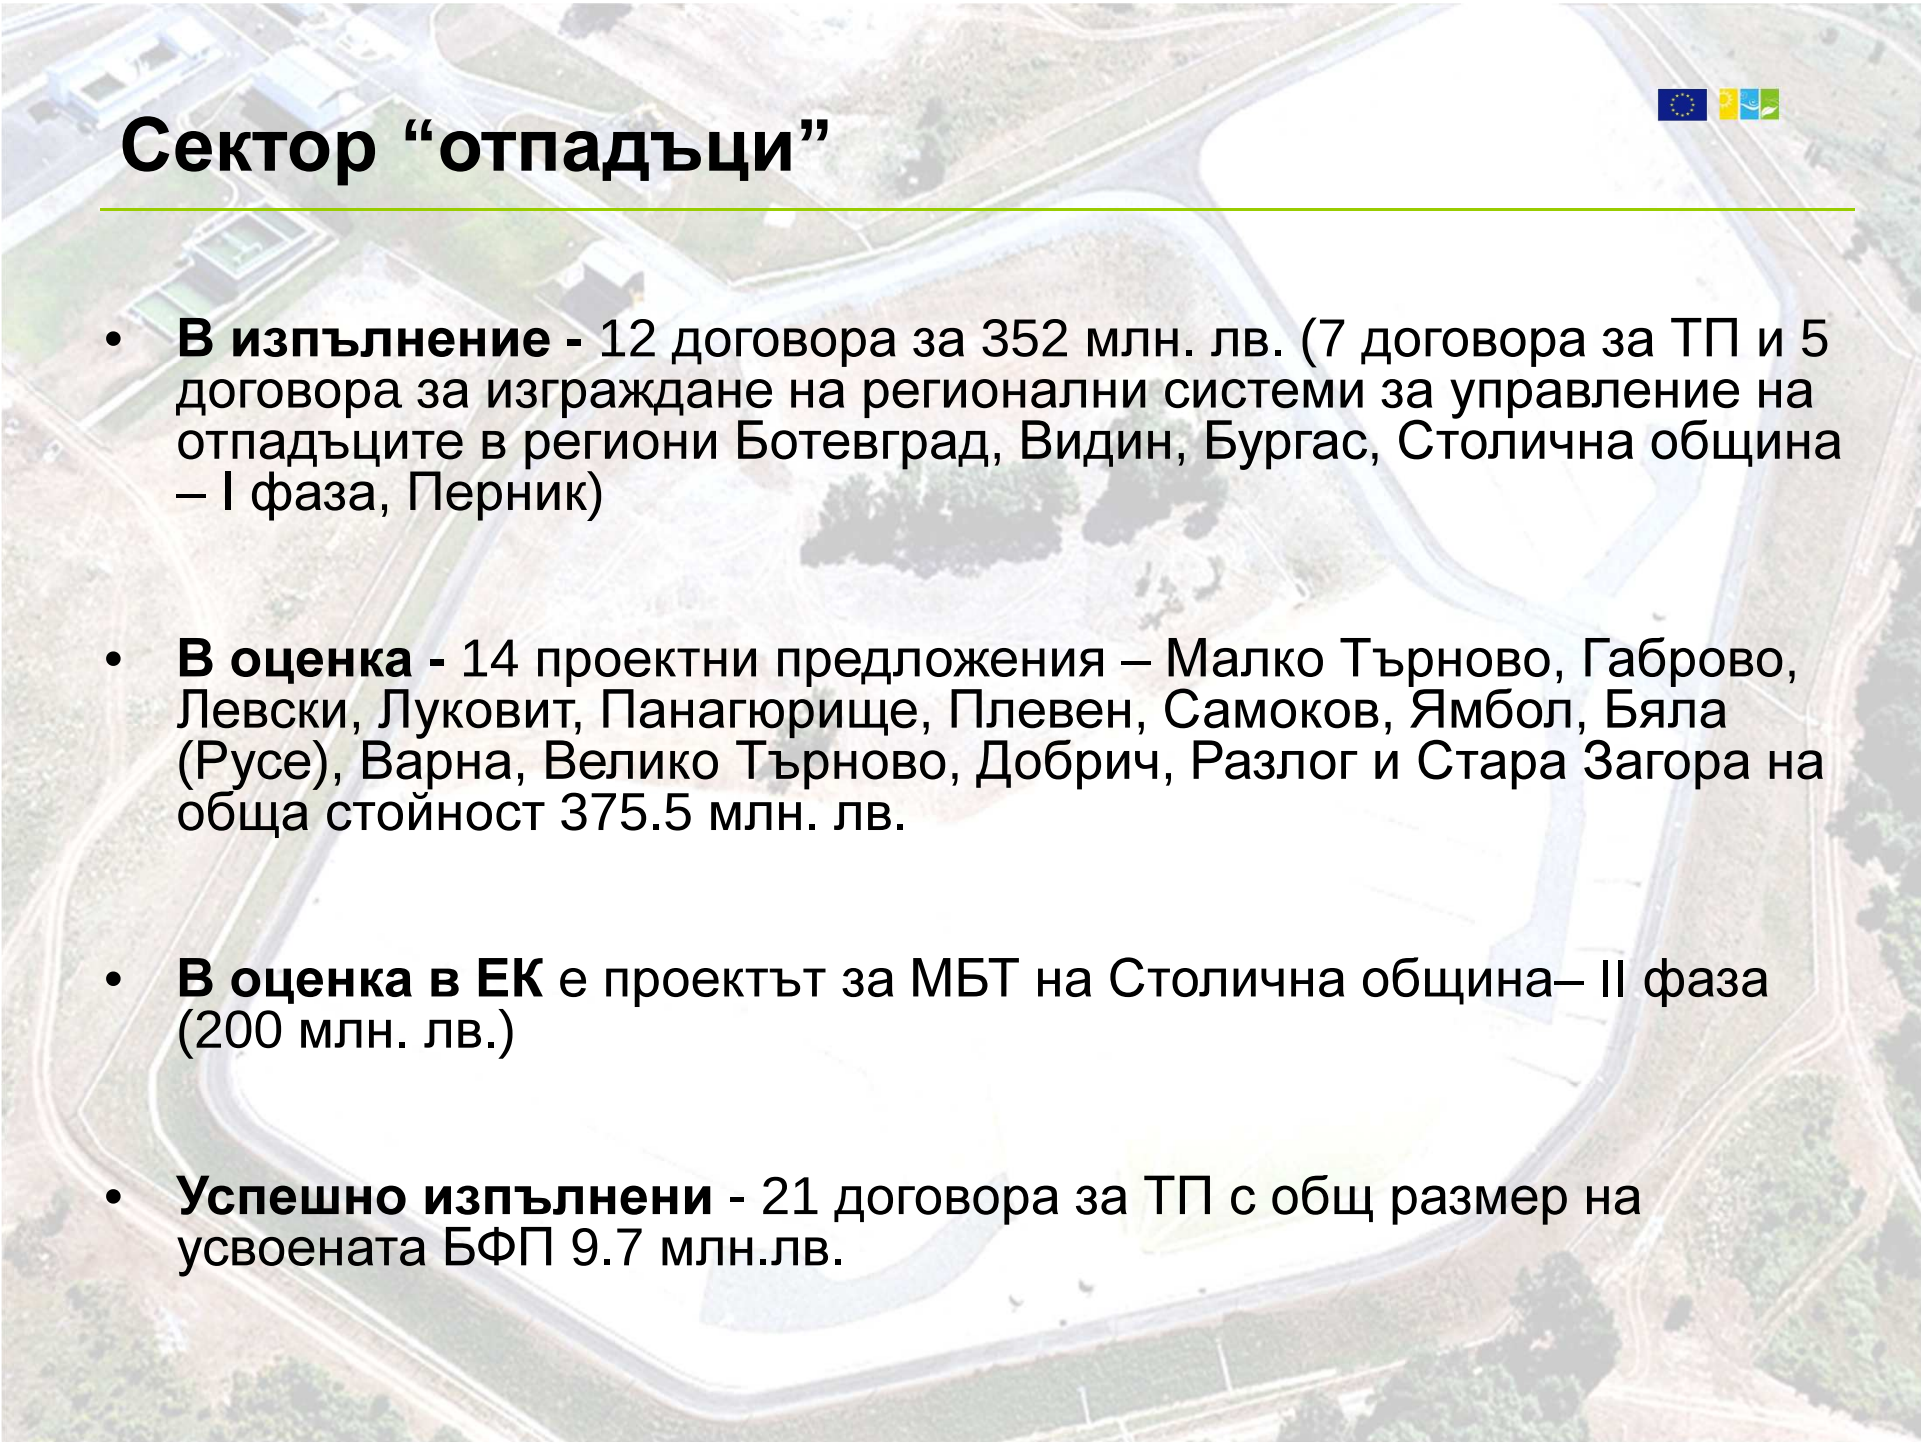

Сектор “отпадъци”

- **В изпълнение** - 12 договора за 352 млн. лв. (7 договора за ТП и 5 договора за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони Ботевград, Видин, Бургас, Столична община – I фаза, Перник)
- **В оценка** - 14 проектни предложения – Малко Търново, Габрово, Левски, Луковит, Панагюрище, Плевен, Самоков, Ямбол, Бяла (Русе), Варна, Велико Търново, Добрич, Разлог и Стара Загора на обща стойност 375.5 млн. лв.
- **В оценка в ЕК** е проектът за МБТ на Столична община– II фаза (200 млн. лв.)
- **Успешно изпълнени** - 21 договора за ТП с общ размер на усвоената БФП 9.7 млн.лв.

Сектор “биоразнообразие”

В изпълнение са 52 договора/заповеди за предоставяне на БФП на обща стойност около 80 млн. лв.



В оценка:

- 18 проекта по процедура Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати
- 11 проекта по процедура Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове



Успешно изпълнен е проект за “Опазване на лешоядите в Източните Родопи” на “Българско дружество за защита на птиците”.





Пуснати в експлоатация обекти и напредък по индикатори

Пуснати в експлоатация:

- 15 инвестиционни обекта в 12 общини: Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград, Казанлък, Хисаря, Бургас, Троян, Столична община, Перник, Каварна и Главиница.

Напредък по индикаторите :

- Изградена и реконструирана канализационна мрежа – **113,67 км**
- Изградена и реконструирана водопроводна мрежа – **43,48 км**
- Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води – **173 078 е.ж.**
- Брой изградени Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) - **3 бр.**
- Брой изградени помпени станции - **4 бр.**
- Брой изградени колектори - **7 бр.**
- Брой изградени тласкатели - **3 бр.**

Предприети мерки по отношение на реформата в секторите “води” и “отпадъци”

- Проект на МРРБ за Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата (16,8 млн. лв.) – *в оценка*
- Проект за Техническа помощ в областта на управление на отпадъците с цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на директива 2008/98/ЕО за отпадъците и за отмяна на определени директиви” (1,2 млн. лв.) – *в изпълнение*



Напредък в реализацията на инвестиционни проекти (1)

Сектор “Води”

- По процедурата за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж – подадени 197 ПИП от 145 общини
- След извършен преглед - констатирани пропуски и неточности в повечето от проектите
- Недостатъчен ресурс за финансиране на всички проекти => необходимост от приоритизиране чрез идентифициране на проекти с най-висока степен на готовност

Актуален статус на проектите за водните цикли на Враца и Габрово –приложения 1 и 2 към доклада



Напредък в реализацията на инвестиционни проекти (2)

Сектор “Отпадъци”

- Ботевград - изграден на над 80 %.
- На 23 февруари 2012 г. община Бургас обяви процедура за избор на изпълнител за строителство
- Общините Перник и Видин предстои да стартират процедурите си за избор на изпълнител за строителство
- Актуалният статус за напредъка на проекта на Столична община е представен като *приложение 3* към доклада

Напредък в реализацията на инвестиционни проекти (3)

Предстоящи процедури

- Постоянен контакт с бенефициентите за подпомагане подготовката на проектите за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на региони Пазарджик, Провадия, Благоевград, Дупница и Своге – предвидени в „Механизма за управление на отпадъците”
- Извършен е анализ на финансовите средства, проектната готовност, както и възможности за финансиране на резервни проекти по приоритетна ос 2 на ОПОС в изпълнение на решение на КН относно дейности, свързани с надграждане и доизграждане на регионални системи извън 23-те.
- Подготовка на схема за закриване /рекултивиране на общински депа за отпадъци, също в изпълнение на решение на КН.
- Ресурс за изпълнение на тези дейности се освобождава и от реализираните икономии по приключващи проекти.

Междинна и вътрешна оценка

Междинна оценка на програмата

- Обществената поръчка обявена бе обявена през август 2011 г.
- Подадени 7 оферти.
- Проведено е заседанието за отваряне на офертите на 9 април 2012 г.
- След изтичане на 10-дневния срок за обжалване, Комисията ще излезе с решение за избор на изпълнител за поръчката.

Вътрешна оценка на програмата

- Основна цел - да бъде направен преглед на различните аспекти на изпълнението на ОПОС (степеня, в която са постигнати целите на програмата, както и да бъдат представени препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г.)
- Проведени интервюта с ключови експерти в МЗ и УО
- Изпратени въпросници до всички бенефициенти, засягащи процеса на подготовка, кандидатстване и изпълнение на проектите по ОПОС
- Събраната информация се обработва и анализира.
- В срок до 25 април 2012 г. ще бъде изготвен предварителен доклад с препоръки

Прогнози съгласно LOTNAR през 2012 г.

Договаряне – предвижда се да бъдат договорени 2,358 млрд.лв. При изпълнение на прогнозата до края на 2012 г. целият наличен ресурс по програмата ще бъде договорен.

Верификация – предвижда се да бъдат верифицирани разходи за 246,6 млн.лв., с което общата стойност с натрупване от началото на програмния период ще достигне 480,03 млн.лв. или 13,63 % от бюджета на ОПОС.

** В системата LOTNAR извършените авансови плащания не се прогнозират и отчитат.*

Сертификация – предвижда се да бъдат сертифицирани разходи за 225,72 млн.лв., с което общата стойност с натрупване от началото на програмния период ще достигне 392,58 млн.лв. или 11,15 % от бюджета на програмата.

Изпълнение на прогнозата през първото тримесечие на 2012

	Изпълнение в %
Договаряне	93 %
Верификация	101 %
Сертификация	94 %

Предприети мерки в подкрепа на бенефициентите

- На среща в Министерски съвет бе решено институциите, свързани с процеса по съгласуване на административни процедури, **да разглеждат приоритетно преписките на общините с инфраструктурни проекти** за изграждане на ВиК мрежи, пречиствателни станции и депа за отпадъци със средства от ОПОС с оглед стратегическото значение на инвестициите
- **МОСВ формира мобилни групи от експерти**, които ще подпомагат екипите на общините по места в началната фаза на изпълнение на проектите
- С цел унифициране подхода при осъществяването на предварителен контрол, по-висока ефективност при възлагане на обществените поръчки, намаляване на допусканите грешки и ограничаване на случаите, в които се налагат финансови корекции **бе въведен нов ред за осъществяване на предварителен контрол.**

На предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) подлежат всички процедури на възложители - териториални органи на изпълнителната власт, на стойност равни или по-високи от 2 400 000 лв. - за строителство и 377 469 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект.

Тематични области в сектор “околна среда” 2014-2020 г.

- Подобряване и развитие на инфраструктурата за **питейни и отпадъчни води** и изпълнение на мерки, заложи в планове за управление на риска от наводнения;
- Опазване и възстановяване на **биологичното разнообразие**, включително НАТУРА 2000, вкл. изпълнение на заложените мерки в Националната приоритетна рамка от мерки (Prioritised Action Frameworks) за опазване или възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на приоритетни типове естествени местообитания и приоритетни видове (вкл. поддържане и подобряване състоянието на екосистемите и предлаганите от тях услуги чрез изграждане на „зелена инфраструктура”;
- Подобряване управлението на **отпадъците**, вкл. мерки насочени към повишаване процента на повторното използване/рециклиране на отпадъци – предвидени за изпълнение основно чрез финансови инструменти (инженеринг);
- Ефективно използване на ресурсите и адаптация и борба с **изменения в климата**
- Разработване на стратегически документи на национално ниво и на съответните прилагащи документи (ръководства, методически указания и др.)

Интегриране на политиката по околна среда в секторните политики на национално ниво

- Стартира процеса на разработване на *Насоки за интегриране на политиката по околна среда в регионалната политика*.
- Бе сформирана вътрешноведомствена работна група в рамките на МОСВ, която ще извърши преглед на наличните документи и ще предложи концепция за интегрирането на политиката по околна среда.
- Първото заседание на РГ бе проведено на 30 март 2012 г. На следващ етап ще бъде свикана междуведомствена работна група със задачи
 - 1) да разработи конкретни мерки, свързани с околната среда, които следва да бъдат включени в другите ОП и
 - 2) да разработи ясни, конкретни и измерими „зелени” критерии и индикатори за прилагане на практика на хоризонталната политика по устойчиво развитие.
- Насоките ще бъдат утвърдени от СКУСЕС и от министъра по управление на средствата от ЕС и следва да бъдат използвани при разработването на всички оперативни програми за периода 2014 – 2020 г.



Програма ИСПА в сектор “околна среда”

- МОСВ управлява **22 финансови меморандума** по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94 – ex ИСПА)
- **19** – за инфраструктурни проекти
- **3** – за техническа помощ



Програма ИСПА в сектор "околна среда"

Финансов резултат:

- Общ ресурс по ИСПА* **€487 млн. (952 млн.лв.)**
- Общо договорено **€541 млн. (1,058 млрд.лв.)**
- Общо платено **€436.6 млн. (854 млн.лв.)**
- Общо усвояване към момента* * **81 %**

*Средства от Финансови меморандуми

**Процентът нараства текущо с разплащания до затваряне на ФМ



Програма ИСПА в сектор “околна среда”

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ сектор “Води”

•15 ПСОВ обслужващи 16 населени места:

Горна Оряховица, Лясковец,
Благоевград, Пазарджик,
Ловеч, Монтана, Севлиево,
Бургас – кв. Меден Рудник
Попово, Смолян, Балчик,
Кюстендил, София (Кубратово),
Варна, Сливен, Търговище;

➤Обслужващи близо 3 млн. е.ж.;

➤Капацитет на пречистване 950 164 m³ на ден.



15 Пречиствателни станции за отпадъчни води





Програма ИСПА в сектор "околна среда"

ВиК мрежи в 15 града за над 1 млн.жители

• **182,3 км** канализационна мрежа

• **246,1 км** водопроводна мрежа

• **2** ПСПВ в Мала Църква и Пасарел

• **2** помпени станции в Нови Искър
и кв. Аспарухово (Варна)



Помпена станция Нови Искър



Програма ИСПА в сектор "околна среда"

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ сектор "Отпадъци"


- **5 регионални депа за отпадъци**

В регионите Монтана, Русе,
Севлиево, Силистра и Созопол,
Обслужващи 29 български общини
с близо 0,562 млн. жители;

- Постигане на съответствие
с екологичните норми



5 Регионални депа за управление на отпадъците

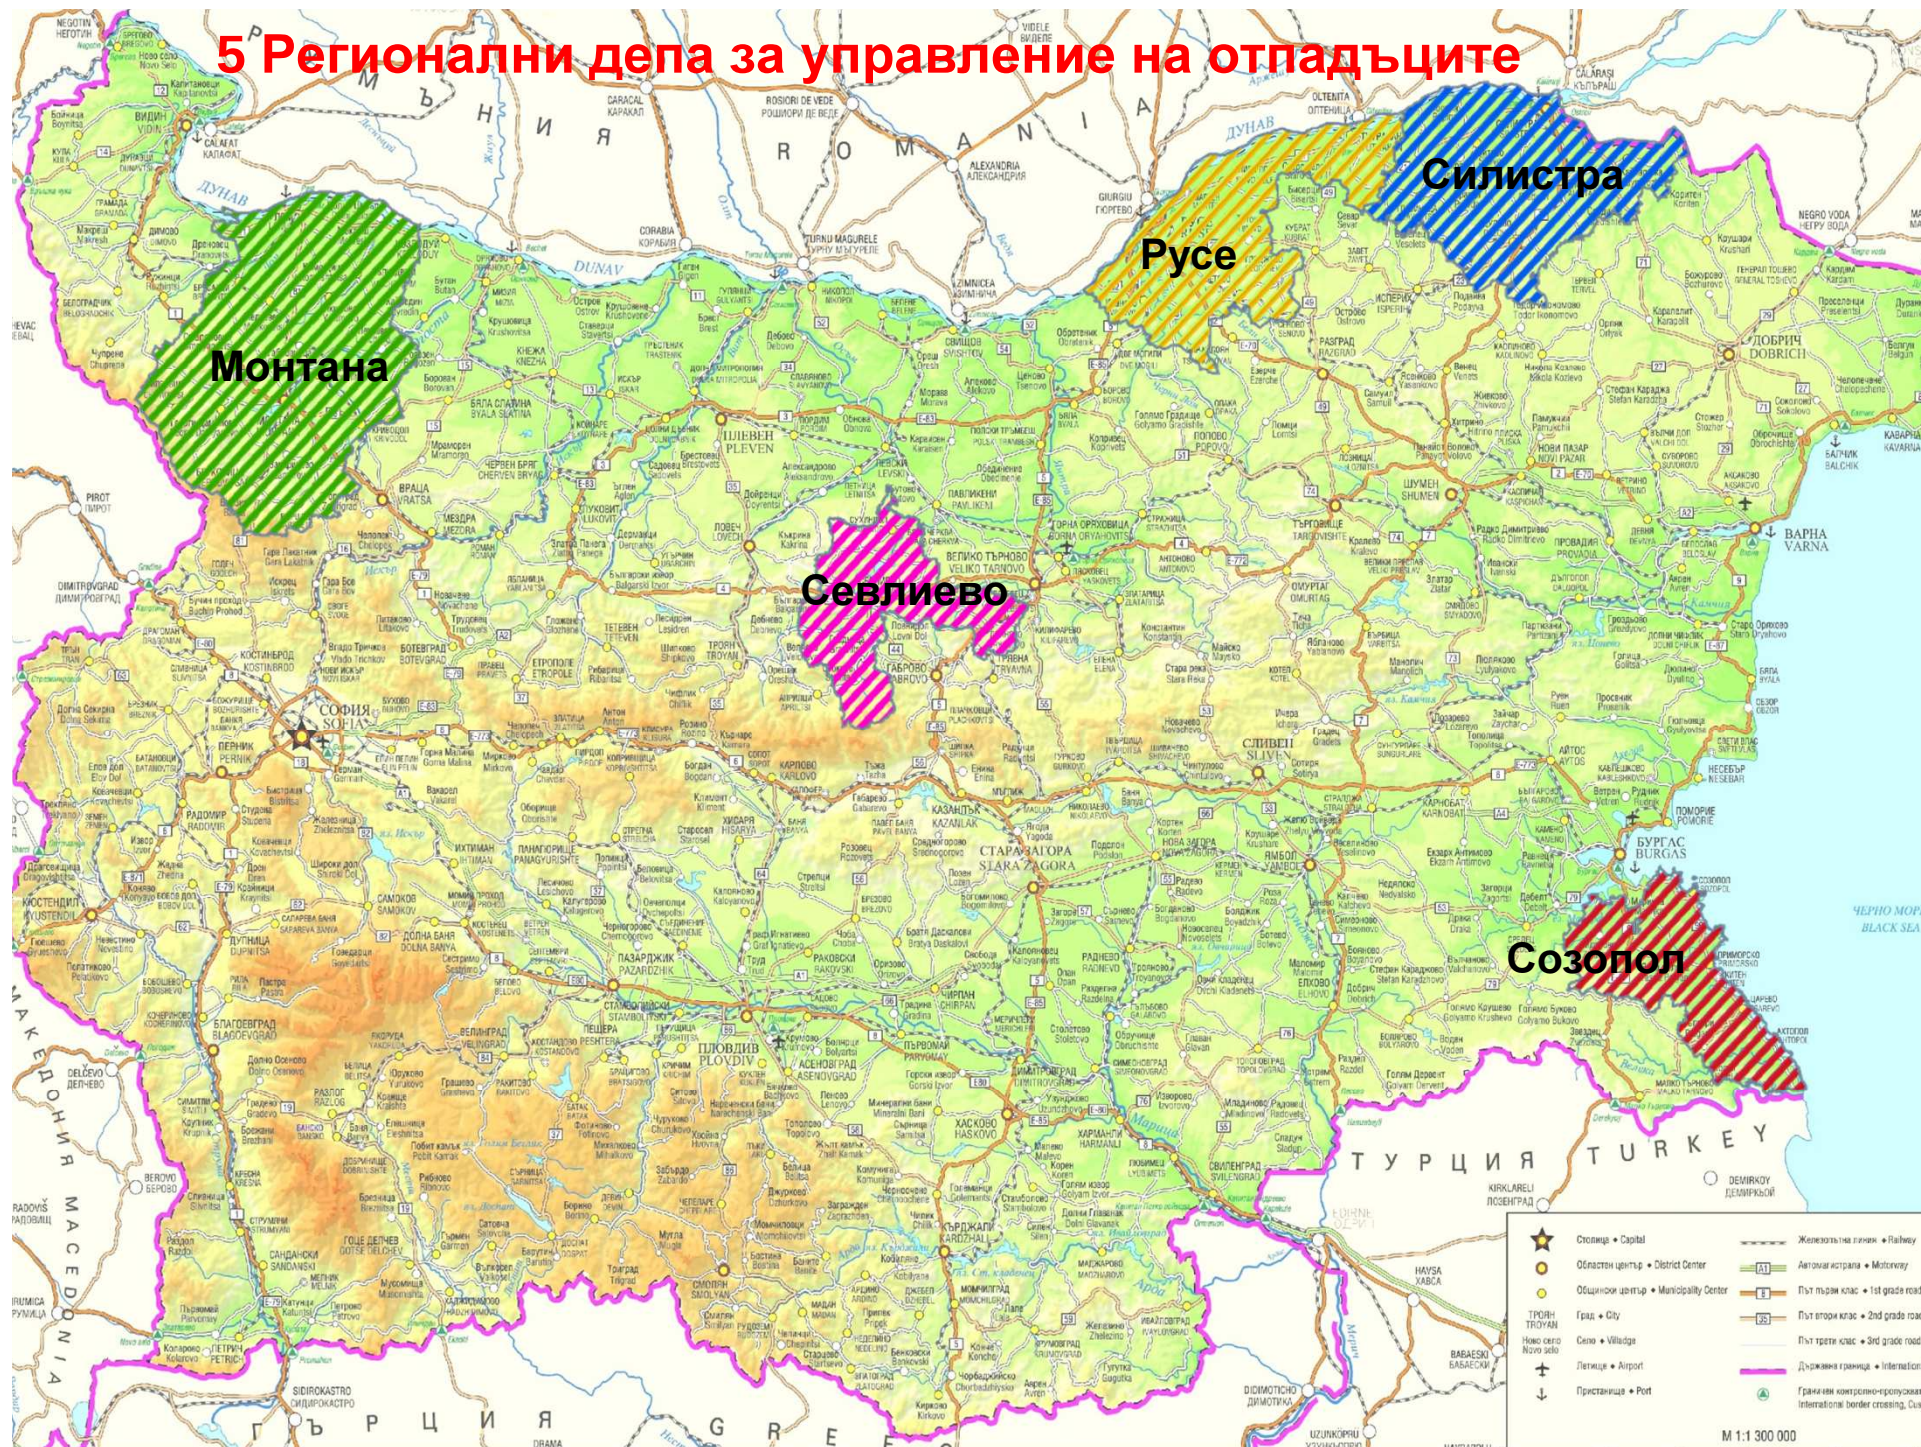



Програма ИСПА в сектор “околна среда”

Приключени проекти по линия на техническа помощ

- **Сектор води:**

- Изготвени проекти за кандидатстване по линия на ОПОС 2007-2013 г. за **16 общини:**
- Пловдив, Добрич, Асеновград, Гоце Делчев, Банско, Ловеч, Монтана, Севлиево, Кърджали, Ямбол, Велико Търново, Благоевград, Горна Оряховица, Долна Оряховица, Лясковец и Перник ;
- Приключва проектирането на ВиК мрежата на гр. Видин
- Обща индикативна стойност на инвестиционните проекти **963 млн. лв. (€ 493 М);**



Програма ИСПА в сектор “околна среда”

Изготвени проекти по линия на техническа помощ:

- **Сектор отпадъци:**

- Изготвени проекти за кандидатстване по линия на ОПОС 2007-2013 г. за **7 региона:**
 - Велико Търново, Левски, Борово, Варна, Стара Загора, Луковит и Костенец;
- Обща индикативна стойност на инвестиционните проекти: **231 млн. лв. (€ 118 М)**



Програма ИСПА в сектор “околна среда” НАУЧЕНИ УРОЦИ

- По отношение на **цялостното управление** – въвличане на всички заинтересовани страни;
- По отношение на **програмиране на разходите** – утвърждаване на многогодишното програмиране и формалния мониторинг и оценка на програмите;
- По отношение на **подготовката на инвестиционните проекти** - изготвяне на обстойни пред-проектни проучвания и оценка на капацитета на системата за изпълнение като първа стъпка към настоящите Генерални планове;
- По отношение на **реализацията на конкретните инвестиции** – предаване на ноу-хау в управление на договори съгласно международните изисквания (FIDIC);
- Въведена **система за управление на риска** – текущ анализ и конкретни мерки за ускоряване на изпълнението;
- По отношение на **финансовото управление** – интегриране на ресурса от пред-присъединителните, присъединителните и националните средства в един стратегически подход за ефективно разходване на средства от различни финансови източници.



Благодаря за вниманието!
